
📌 【小南题解】AP 令和5年春期 午後問9（プロジェクトマネジメント／PM）

> **主题**：金融机构销售支援系统向云端（IaaS）迁移的项目管理全流程
>
> **考点标签**：プロジェクトマネジメント　移行方式　責任共有モデル　匿名加工情報　リスク分析
>
> **难度系数**：⭐⭐⭐☆☆（AP 午后 PM 题标准经典案例，重点考查概念理解与原文对齐）

> 💡 **导读**
> 本题讲述了一个极其典型的 **“老旧系统维保到期 ──► 结合云服务（IaaS）与软件包升级 ──► 迁移策略与风险评估 ──► 利益相关者协调与上线”** 的 PM 全流程架构实战案例。
> 搞懂这道题，你就能彻底掌握 **一括 vs 段階移行、云端責任共有モデル、匿名加工情報合规、定性/定量风险分析工具** 的核心判定逻辑！

🛠️ 1. 系统背景与迁移框架全景图（Project Overview）

🌐 迁移背景与利益相关者诉求（Stakeholder Demands）

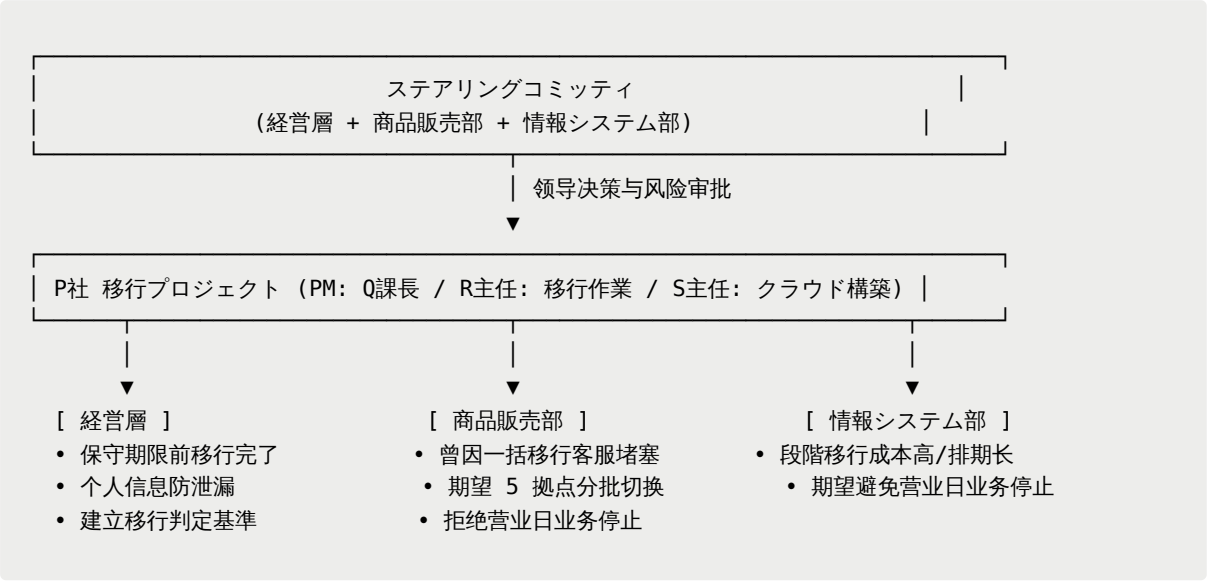

🔑 迁移方式特征对比（一括移行 vs 段階移行）

维度	一括移行方式（Big Bang Cutover）	段階移行方式（Phased Cutover）
工期与窗口	占用集中窗口（如年末年始），**不停止营业日业务**	批次多，需要长时间排期，**难免占用营业日**
运维与成本	新旧系统无长期并行，**成本低、运维负担小**	新旧系统长时间并行，**运维双重负担**
风险与支撑	故障影响全局，**需大幅扩充客服/开发支撑资源**	故障局限于局部批次，风险被分散

🧩 2. 逐题解构与破题要领

🔷 設問 1：项目计划制定（移行方式・责任模型・RFP）

(1) 一括移行方式对于经营层和业务部门的优势（15字以内）

- **题目破题：**
  题干询问：除了对信息系统部（避免新旧系统并行）的优势外，对经营层和商品销售部有何优势？
- **原文线索：**
  商品销售部明确提出："切替えに伴う拠点での営業日の業務停止は、各拠点で特別な対応が必要になるので避けたい"。
  而 P 公司的营业日排除土日祝和年末年始。通过采用一括移行方式，利用年末年始连续假期完成集中切换，成功实现了**在营业日无需暂停业务**。
- ✅ **标准答案：** 営業日に業務の停止が不要（12字）

(2) 在制定具体安全对策之前必须优先完成的工作（选择题）

- **题目破题：**
  针对云服务（IaaS）的引入，S 主任准备直接根据候选厂商的技术信息制定安全对策，但 PM 指出在此之前有更基础的事项需要完成。
- **逻辑推导：**
  在云计算（尤其是 IaaS/PaaS）中，必须首先确定**责任共担模型（責任共有モデル）**，明确云服务提供商与云服务使用者各自的安全职责界限（责任分界点）。若不先明确责任范围，就无法针对使用者自身承担的责任去制定具体的安全措施。
- ✅ **标准答案：** エ（セキュリティ対策の責任範囲の明確化）

(3) Q 课长在评估 IaaS 厂商提案（RFP）时最重视的项（25字以内）

- **题目破题：**
  询问项目经理在评估各 IaaS 厂商的 RFP 提案内容时，最看重的是什么。
- **原文线索：**
  项目启动的根本目的为："クラウドサービスを活用して現状のサーバ機器導入に関する構築期間の短縮やコストの削減を実現し…"。因此评估提案时，核心衡量指标就是看各厂商能够多大程度实现 **利用 IaaS 带来的构建工期缩短与成本削减**。
- ✅ **标准答案：** `IaaS利用による構築期間とコスト`（17字）

🔷 設問 2：迁移作业计划（合规流程・客服支撑・评估文档）

(1) 使用真实数据（本番データ）进行综合测试时 PM 必须履行的手续（35字以内）

- **题目破题：**
  公司规定原则上禁止使用包含个人信息的生产数据进行测试。若要使用，需加工为"匿名加工信息"，且不能仅凭 PM 个人决定。
- **原文线索：**
  项目组成立了由经营层、业务部和 IT 部参加的 **ステアリングコミッティ**（项目指导委员会），专门负责汇报重要风险、应对方针及进行重大决策。使用含有个人信息的生产数据测试属于重要风险事项，必须提交委员会审议并获得批准。
- ✅ **标准答案：** `ステアリングコミッティで本番データを用いたテストの承認を得る`（30字）

(2) 上线初期支撑（初期サポート）中需要持续提供的支援（25字以内）

- **题目破题：**
  一括移行方式最大的痛点在于：上线初期全公司 30 家分支机构的咨询会集中涌向服务台（サービスデスク）。
- **原文线索：**
  过去系统更改导致业务受阻的原因是"开发课人手不足，导致二线升级响应迟缓"。为此，本次迁移采取的对应支援措施就是：**扩充用于二线升级响应的开发课人力资源**。
- ✅ **标准答案：** `エスカレーション対応の開発課リソースの拡充`（21字）

(3) 评估新系统能否正式上线切换所依据的文档名称（10字以内）

- **题目破题：**
  根据文中原词（本文中の字句を用いて），寻找用于判定新系统是否具备切换上线条件的文档。

- **原文线索：**
  【ステークホルダの要求】中明确写道：“経営層からは･･･新システムへの移行を判断する**移行判定基準**を作成すること、が指示された”。对应填入文档名即为“移行判定基準書”。
- ✅ **标准答案：** `移行判定基準書`（7字）

🔷 設問 3：风险管理（定性分析・定量分析・延期应对）

(1) 风险分析工具 [a] 与 [b] 的填空

> 💡 **小南考点知识库**
>
> - **定性的分析 ──► 発生確率・影響度マトリックス**（概率影响度矩阵：利用高/中/低定性划定风险优先级）。
> - **定量的分析 ──► 感度分析**（敏感性分析：计算单一变量数值波动对项目目标的定量影响大小，常通过**トルネードグラフ**展示）。

- **[a] 逻辑**：题干明确“定性的分析で使用される”、“分析结果汇总为表格/矩阵”，应选择 `オ`（発生確率・影響度マトリックス）。
- **[b] 逻辑**：题干明确“定量的分析”、“判断影响最大的风险项”，应选择 `ア`（感度分析）。
- ✅ **标准答案：**
  - **a:** `オ`（発生確率・影響度マトリックス）
  - **b:** `ア`（感度分析）

(2) 若无法在 3 月末前完成迁移，针对旧系统运行延长应采取的对策（20字以内）

- **题目破题：**
  如果迁移出现重大延误，导致新系统无法在 3 月末维保到期前上线，就不得不强制延长旧系统的运行。除了准备项目延期本身的费用外，还必须针对旧系统延长运行产生的后果制定对策。
- **逻辑推导：**
  旧系统维保合同到期后若强制延长运行，厂商会收取大幅上涨的维保费用（保守费用が大幅に上昇する）。因此必须提前在预算中规划并确保这笔**追加产生的维保费用**（即预留 Contingency Reserve）。
- ✅ **标准答案：** `追加発生する保守費用の確保`（13字）

📝 3. 考点总结

###🎯 AP 午后 PM 必考核心金句
1. **クラウド責任共有モデル（Shared Responsibility Model)**：
    - IaaS 模式下，厂商管机房与虚拟化硬件，用户管 OS、中间件与应用安全。
    - 任何云端安全措施的设计，均以“明确责任分界点（責任範囲の明確化）”为绝对前提。

2. **個人情報保護法与测试数据**：
    - 本番数据原则上不可直接用于测试。
    - 若必须使用，需不可逆地加工为“匿名加工情報”，且必须经过 Governance 机构（ステアリングコミッティ）合规审批。

3. **项目风险管理工具对照**：
    - 定性风险分析：発生確率・影響度マトリックス（概率与影响度矩阵）。
    - 定量风险分析：感度分析（敏感性分析）、トルネードグラフ（龙卷风图）。
    - 专家共识收集：デルファイ法（德尔菲法）。
